

停工整改报告

致克拉玛依市生态环境局：

我单位已按照整改计划完成整改任务，整改完成情况如下：

1. 已完成对泄露设备的修理修缮，更换过滤机后轴封 1 个，恢复设备完整性；
2. 已完成在过滤机下方铺设防渗膜；
3. 已将污水产水池边地块区域重新进行水泥硬化，并已经将彩钢板底部地面区域缝隙用水泥封堵死；
4. 已将过滤机与污水设备区域用彩钢板进行了有效的物理隔离，防止该事件的再次发生。

我单位将持续做好环保自检自查及整改相关工作，并做好员工培训宣贯和作业设备设施的检查，保障生产作业及环保设备设施的完整性。

新疆德丰亿升石油防腐工程有限公司






过滤机与污水设备隔离后的照片



过滤机下方铺设防渗膜




底部地面区域硬化及缝隙用水泥封死

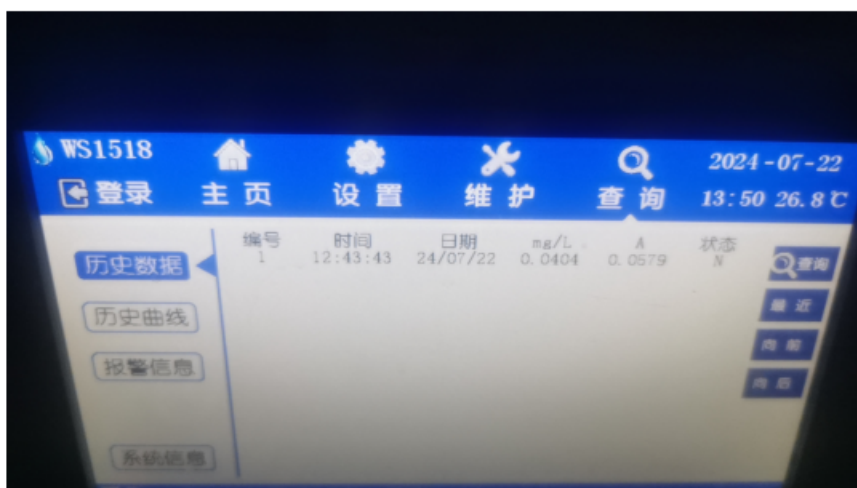

整改后总镍在线监测检测数据

整改相关数据对比

整改	用电量 (KW.H)	用水量 (m3)	产品产量 (吨)
整改前	172440	792.8	1580
整改期间	134880	410	686

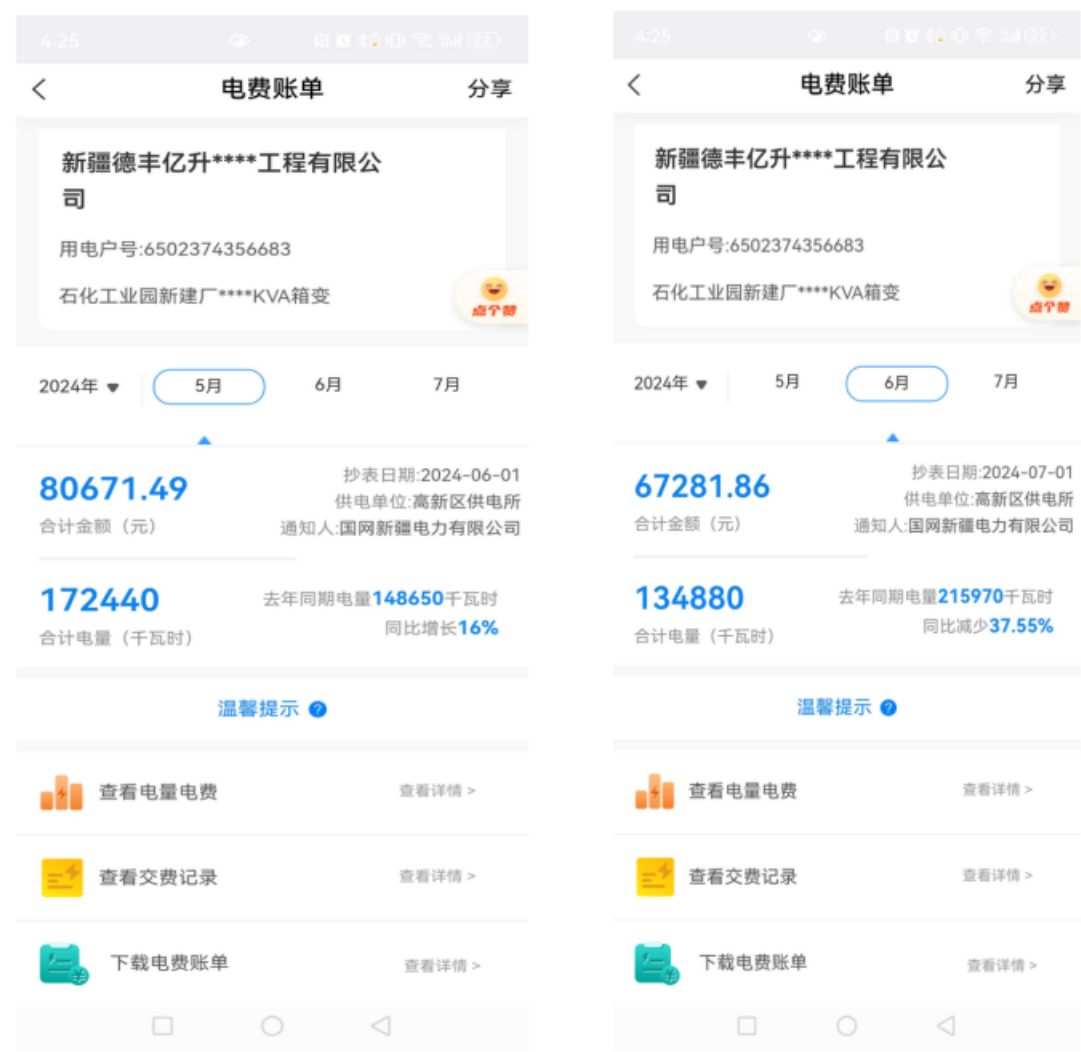

电量对比照片




水量抄表数据



当前位置: 首页 > 通知公告

停工报告



停工整改计划

致克拉玛依市生态环境局:

我单位因钨合金生产线一台镀液过滤机内的后轴封机械密封损坏,导致过滤机轴封不严,镀液从过滤机轴封密封处泄露,流入污水检测池,致使检测池污水镍浓度超标。

公司排查发现这一问题后,立即暂停了该生产线生产作业,并做出了如下整改措施。

1. 安排人员对泄露设备开展修理修缮,更换过滤机后轴封,恢复设备完整性;
2. 在过滤机下方铺设防渗膜;
3. 在污水产水池边地块区域重新硬化水泥,并将彩钢板底部地面区域缝隙用水泥封死;
4. 将过滤机与污水设备区域用彩钢板进行了有效的物理隔离,防止该事件的再次发生。

我单位将持续做好环保自查及整改相关工作,并做好员工培训宣贯和作业设备设施的检查,保障生产作业及环保设备设施的完整性,整改任务完成后及时将整改完成情况和整改信息向社会公开,并向克拉玛依市生态环境局备案。



社会公开公示情况

